



# PROJET ECMS RÉUNION DE PLACE

BANQUE DE FRANCE:  
ALEXANDRE GAUTIER

DALIBOT VÉRONIQUE

CATAU OLIVIER  
CORMEIL LARA  
ROULEAU ELZBIETA


PALLISE RHIM

**13 février 2025**

*BDF-PUBLIC*

BANQUE DE FRANCE  
EUROSYSTÈME

STABILITÉ  
FINANCIÈRE  
ET OPÉRATIONS




# INTRODUCTION PAR ALEXANDRE GAUTIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA STABILITÉ  
FINANCIÈRE ET DES OPÉRATIONS



BANQUE DE FRANCE  
EUROSYSTEME

STABILITÉ  
FINANCIÈRE  
ET OPÉRATIONS




# SOMMAIRE

- 1 PLANNING ET COORDINATION
- 2 BILAN DES TESTS FONCTIONNELS
- 3 BILAN DES TESTS DE VOLUME
- 4 MIGRATION
- 5 FOCUS TECHNIQUE ET LEGAL
- 6 ANNEXES


# 1

## PLANNING ET COORDINATION




# CALENDRIER

ECMS PREPROD PREPROD environment  
ECMS PROD Production environment

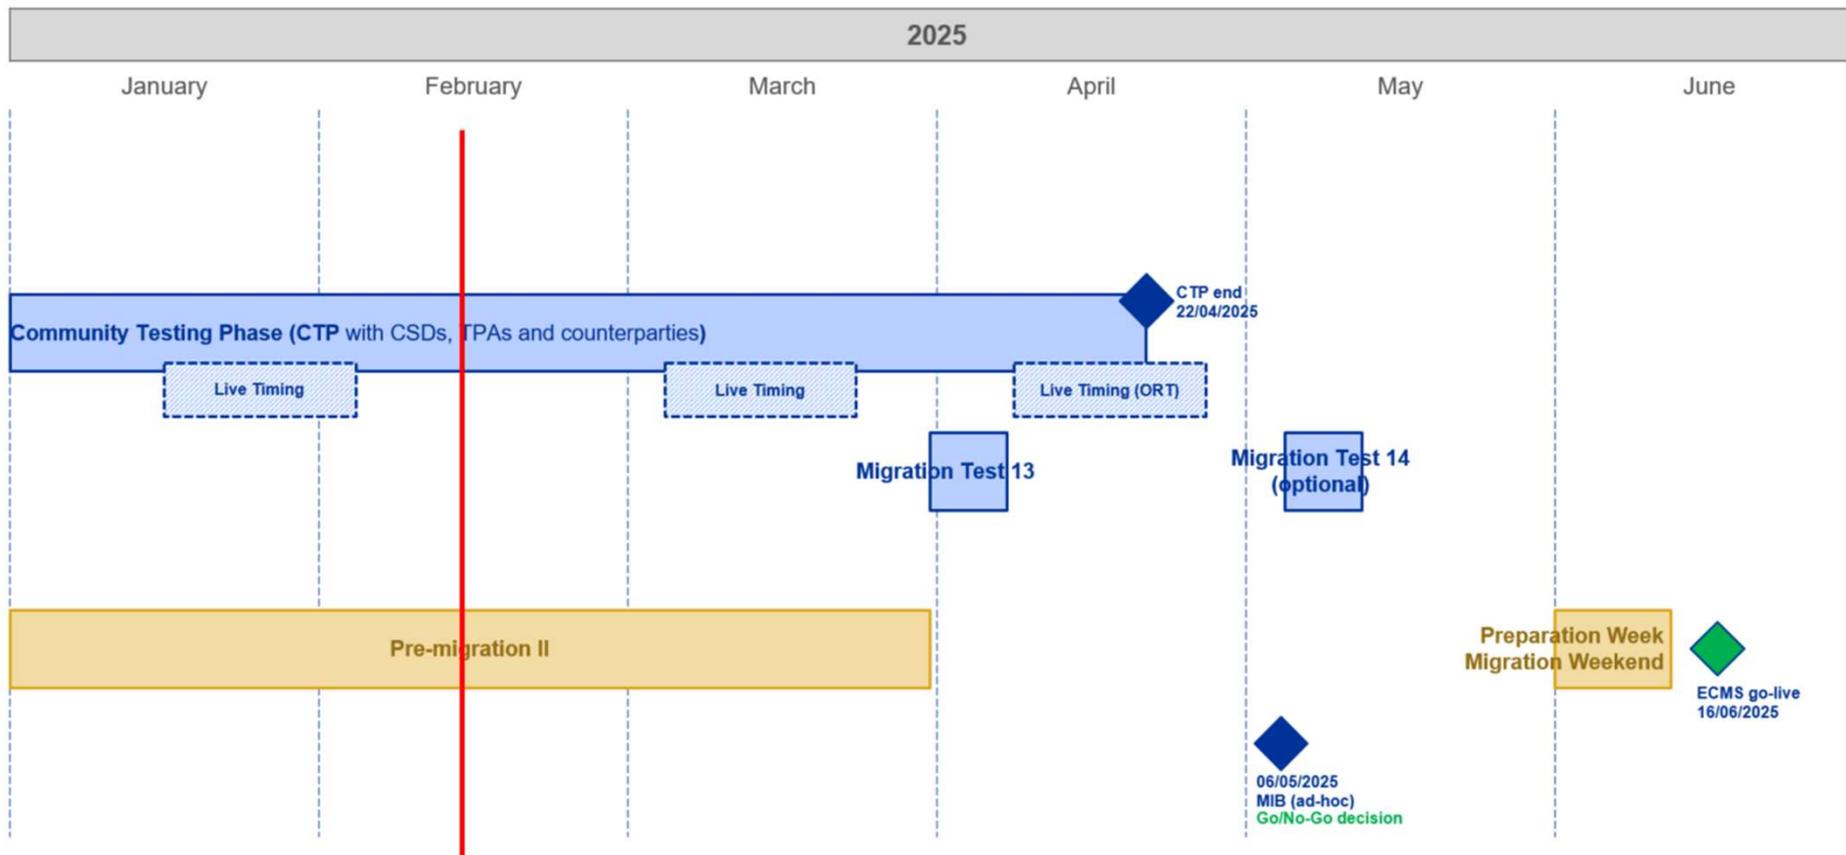

# FOCUS

## PLANNING ACTIONS DES CONTREPARTIES

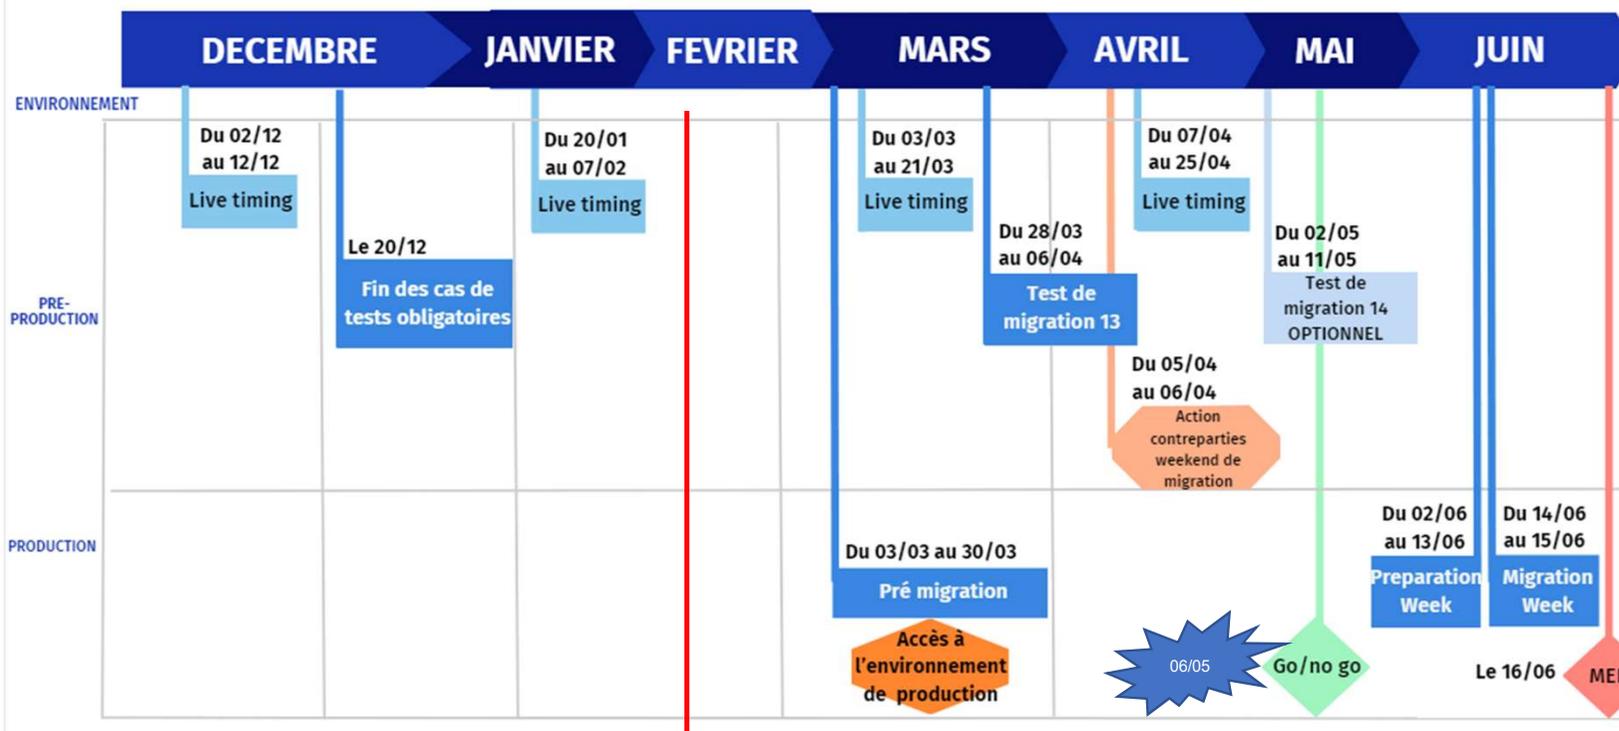

NB : Toutes ces actions sont sous réserve d'obtention d'un feu vert par la BdF

# COORDINATION PROJET ECMS

## Programme de formation sur ECMS au mois de janvier 2025

- ▶ La Banque de France a proposé un programme de formation sur les fonctionnalités ECMS depuis le mois de janvier 2025, afin de contribuer à l'adaptation opérationnelle des contreparties françaises et compléter leurs propres efforts de formation.
- ▶ Il a pris la forme de webinaires combinant la présentation des règles de gestion des fonctionnalités et des démonstrations sur l'application.
- ▶ Le calendrier des webinaires au mois de janvier a été le suivant (supports et vidéos publiés sur le site internet Banque de France):

- |  |   |
|--|---|
| • <i>Formation présentation projet</i>       | <i>vendredi 10 janvier 9:30 – 11:00</i>     |
| • <i>Formation données référentielles</i>    | <i>lundi 13 janvier 2025 15:00-16:30</i>    |
| • <i>Formation données Titres</i>            | <i>mardi 14 janvier 2025 14:00 – 15:30</i>  |
| • <i>Formation Statements&amp;Reporting</i>  | <i>mercredi 15 janvier 15:30-16:30</i>      |
| • <i>Formation OMO</i>                       | <i>vendredi 17 janvier 2025 10:30-12:00</i> |
| • <i>Formation pool ligne de crédit</i>      | <i>mardi 21 janvier 10h-11h30</i>           |
| • <i>Formation Créances privées partie 1</i> | <i>mercredi 22 janvier 2025 15:00-16:30</i> |
| • <i>Formation Créances privées partie 2</i> | <i>vendredi 24 janvier 2025 10:30-12:00</i> |

# PLANNING POUR LA PRE-PRODUCTION

## COMMUNITY TESTING PHASE 2E

**Jusqu'au 22 avril 2025**

58% des contreparties ont reçu leur Rapport final sur les cas de tests réalisés.

## Fenêtres LIVE-TIMING – business day testing 2025

Deux fenêtres de 3 semaines. Les vendredis de chaque semaine en journée réduite (Release day).

- ▶ 3 mars 2025 au 21 mars 2025
- ▶ 7 avril 2025 au 25 avril 2025

Note : Le chronogramme appliqué en Live-Timing est disponible dans les [ECMS Testing Conditions](#) et dans le document partagé sur le site internet Banque de France : « [Chronogramme ECMS](#) ».

## Test de Migration 13 - du 28 mars au 6 avril 2025

# PLANNING POUR LA PRODUCTION


## FENETRE DE PRE-MIGRATION EN PRODUCTION

Réouverture de l'environnement de Production pour les contreparties : du 3 mars jusqu'au 30 mars 2025

- ▶ Vérification par les contreparties des données référentielles configurées par la Banque de France sur la base du formulaire Registration Form. Date limite: 14 mars 2025
- ▶ Configuration des utilisateurs intervenant en Production et attribution de leurs rôles

# 2

## BILAN DES TESTS FONCTIONNELS



# RAPPORT FINAL SUR LES CAS DE TESTS REALISES

## Bilan

- ▶ La Banque de France a commencé à adresser le Rapport final sur les cas de tests réalisés par les contreparties
- ▶ **30** contreparties ont reçu le rapport final.
  
- ▶ **4** contreparties pourront recevoir ce rapport une fois les dernières preuves sur les cas de tests fondamentaux transmises.
- ▶ Il est impératif de nous renvoyer ces preuves, avant le jeudi 13 février 2025, pour pouvoir être autorisé à passer en production.
  
- ▶ Enfin les **17 contreparties** restantes recevront ce rapport après analyse du résultat des tests de volume du dernier live-timing.

Les contreparties sont invitées à poursuivre l'envoi des volumes, même si elles ont déjà validé le test de volumétrie précédent.

# OPEN MARKET OPERATIONS (OMO), STANDING FACILITIES, CREDIT FREEZING

## Open Market Operations (OMO)

- ▶ Depuis la dernière Réunion de place fin novembre, 2 nouvelles campagnes OMO :
  - Du 26 novembre au 11 décembre 2024 (MRO, LTRO & Early Repayment LTRO, FTD, USD) : problèmes d'arrondi détectés pour le calcul des intérêts, et sur le Confirm FX Payment lors de la maturité d'un titre USD.
  - Du 27 janvier au 06 février 2025 (MRO, LTRO & Early Repayment LTRO, FTD, USD) **pendant la période de live timing** : côté FR, problèmes locaux de pool locké, bloquant les flux avec CLM et empêchant la mise à jour des statuts. Cas de figure rencontré par de nombreuses BCNs, lié aux problèmes de journée opérationnelle. Situation résolue suite à un Hotfix déployé le 03/02, mais déblocage manuel des pools nécessaire.
- ▶ Deux nouvelles campagnes sont prévues par la BCE:
  - **OMO campaign - 03/03 - 19/03 (pendant la prochaine période de live timing)** – afin de vérifier le bon fonctionnement sans intervention 4CB.
  - **OMO campaign - 07/04 – 22/04**
- ▶ Ces prochaines campagnes donneront lieu à des tests de bout-en-bout, avec saisie des soumissions par les contreparties dans TELMA Homologation.

## Standing Facilities (MLOR & AML)

- ▶ Fonctionnalité stable.

## Credit Freezing (type ECONS)

- ▶ Le dernier test en EAC en Janvier est globalement satisfaisant mais des correctifs sont en attente de livraison coté 4CB.
- ▶ La date du prochain en pré-production a été décalée à fin mars, après le live timing. Pour l'instant la BCE ne nous a pas communiqué de date exacte.

# TITRES

## Titres

- ▶ Domestique: Fonctionnalité stable, pas de blocage spécifique détecté
- ▶ Central Bank Access (CBA): Fonctionnalité stable, pas de blocage spécifique détecté
- ▶ CCBM:
  - Clearstream Bank Luxembourg: toutes les nationalités d'ISIN disponibles en LuxCSD ont été éprouvées et validées en U2A et / ou A2A
  - Iberclear indisponible en UTEST jusqu'à mi-mars
- ▶ Campagne finale de recensement de l'activité cible en Marketable Assets CCBM des contreparties françaises à venir.
- ▶ Pour rappel, il est nécessaire d'avoir validé les tests en pré-production pour pouvoir utiliser un couple ISIN + PSET (place de dénouement) en production
  - L'objectif de cette stratégie est de protéger les contreparties d'instructions non dénouées en environnement de production.
  - Le périmètre des tests a été validé avec les contreparties sur la base de:
    - Leur activité en PROD depuis début 2023
    - Leurs indications
  - Les contreparties sont autorisées à utiliser un couple à partir du moment où elles ont réussi une mob, une démob de ce titre ainsi que les annulations correspondantes
- ▶ **Les contreparties ne participant pas à ces tests seront considérées comme ne faisant pas de CCBM.**

# CREANCES PRIVEES

## Exercice de réinitialisation – janvier 2025

- ▶ Exercice réalisé sur les Créances privées FR uniquement, entre le 8 et le 22 janvier
- ▶ La reprise des tests a été possible avec 2,5 jours de retard, du fait de problématiques techniques et indisponibilités d'ECMS
- ▶ Un incident a été relevé post exercice concernant les notations IRB (certaines notations n'ont pas été migrées)

## Fonctionnalité

- ▶ Plusieurs problématiques apparues concernant la génération des Processing Report : pendant la phase de live-timing de janvier (résolu via hot-fix), et nouvelle régression observée depuis le 10 février (en cours d'analyse pour livraison d'un hot-fix)
- ▶ L'heure du cut-off pour les fichiers A2A – actuellement prévue à 16h – sera repoussée . Le document BCE correspondant sera mis à jour, mais sans calendrier de diffusion connu à ce stade
- ▶ Plusieurs contreparties réalisent des envois quotidiens, les fichiers se traitent globalement sans difficulté et automatiquement, hors cas particulier ci-dessous
- ▶ Des problématiques ciblées restent en cours d'analyse, particulièrement concernant certains fichiers qui n'ont pas été traités correctement et rejetés manuellement par les équipes Banque de France (4 fichiers). Des mesures de contournement manuelles sont en place

# NEUTRALISATION ET BILLING

## Neutralisation

- ▶ Fonctionnalité stable, pas de blocage spécifique détecté

## Billing

- ▶ Campagne de janvier en pré-production réalisée avec un échantillon de BCNs correspondantes
- ▶ Tests satisfaisants donc ouverture prochaine à l'ensemble des BCNs
- ▶ Les contreparties seront contactées dans le cas où une action est attendue de leur part

# CORPORATE ACTIONS

## ➤ Points transversaux

Résultats de l'enquête à destination des contreparties

Formation OST à venir : visio fin mars sur les fonctions de base + avancées (REPL,CANC, RVSL)

Campagnes de tests à venir : 1 en mars et 1 en avril suite au MIG13 (Volumes / iso prod ? )

## ➤ Nous contacter :

**Boîte mail BDF OST**

4045-ECMS-OST-TESTS-UT@banque-france.fr

**Sharebox**

<https://share-box.banque-france.fr/share-access/sharings/EqzqqxYs.Eqqqqms0#/filer/share-access>

# CORPORATE ACTIONS

## ➤ Point sur la campagne OST :

Cas de tests fondamentaux OK 

## ➤ Point sur la dernière campagne

INTR en semaine 1 OK


Autres tests KO : problèmes de positions (chargement automatique, Mob/démob, ...)

## ➤ Tests en CCBM

Tests CCBM BDF = HCB en cours avec LU et DE  
ES PCAL sera testé en avril

# 3

## BILAN DES TESTS DE VOLUME



# PRINCIPE DU BUSINESS DAY TESTING

- ▶ En plus des tests obligatoires, la Banque de France a demandé aux contreparties de transmettre 100 % de leurs volumes de production à ECMS lors des cycles de Live-Timing pour valider la capacité du système à gérer les volumes et respecter les délais de production.

## Critères de réussite :

- ▶ Transmission complète des volumes de production par les contreparties.
- ▶ Fonctionnement correct des processus de gestion du collatéral et des opérations de crédit.
- ▶ Évaluation conjointe par la Banque de France et les contreparties.

## Bilan :

- ▶ La majorité des contreparties ont participé au test de volumétrie demandé par la Banque de France, entraînant une forte augmentation des volumes d'instructions
- ▶ Ce test a confirmé plusieurs améliorations observées depuis novembre 2024, notamment concernant les temps de traitement des fichiers quotidiens et la capacité d'ECMS à traiter ces volumes
- ▶ Les problématiques ciblées identifiées font l'objet d'un suivi rapproché avec le projet
- ▶ Les prochaines phases de live-timing seront utiles pour vérifier la stabilité des traitements et la résolution des problématiques restantes

# PARTICIPATION SUR LES TITRES

Le test de volume de la Banque de France a conduit à des tests intenses sur la Place française

► Pour les Titres, les 13 contreparties concernées ont participé et ont validé les attendus:

Contreparties	1ère semaine	2ème semaine	3ème semaine
Contrepartie 1	100%	140%	60%
Contrepartie 2	200%	200%	120%
Contrepartie 3	640%	300%	540%
Contrepartie 4	0%	83%	157%
Contrepartie 5	80%	100%	100%
Contrepartie 6	140%	220%	140%
Contrepartie 7	103%	0%	3%
Contrepartie 8	100%	0%	0%
Contrepartie 9	123%	100%	120%
Contrepartie 10	220%	240%	180%
Contrepartie 11	160%	100%	200%
Contrepartie 12	40%	340%	280%
Contrepartie 13	180%	20%	0%

- L'objectif était d'obtenir au total 170 mobilisations par semaine, c'est-à-dire le volume hebdomadaire d'opérations dénouées au T3 2022.
- L'objectif a été atteint lors de la première et de la troisième semaine du dernier exercice de live-timing (20 janvier – 07 février) au global, c'est-à-dire si l'on observe la somme des instructions envoyées par toutes les contreparties et non l'activité de chaque contrepartie individuellement.
- En effet, comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, certaines contreparties ont instruit largement plus que ce qui était attendu de leur part quand d'autres contreparties n'ont pas instruit du tout.
- Sur les 1458 instructions envoyées depuis le démarrage du live-timing, une vingtaine sont restées avec le sous-statut « Waiting for global collateral position update », qui indique un problème de communication entre CLM et ECMS. Cette anomalie est suivie par le service desk via plusieurs incidents et

# PARTICIPATION SUR LES CRÉANCES PRIVÉES

Pour les créances, l'objectif était d'envoyer 100% des volumes de production. Les 11 contreparties créances privées soumises aux tests de volumétries se sont fortement impliquées sur le test, ce qui s'est traduit par une forte augmentation du volume d'instructions envoyées à ECMS.

Live-timing janvier-février 2025						
Contrepartie	Enregistrements	Remboursements	Notations	Mobilisation	Démobilisation	Certification volumétrie
N° 1	100 %	NA	NA	100 %	100 %	Déjà OK
N° 2	90%	100 %	NA	94%	100 %	OK
N° 3	50%	22%	NA	50%	45%	NOK
N° 4	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	Déjà OK
N° 5	100 %	99 %	NA	100 %	100 %	Déjà OK
N° 6	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	Déjà OK
N° 7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Déjà OK
N° 8	67%	100 %	39%	100 %	100 %	Déjà OK
N° 9	66%	100 %	46%	66%	47%	Déjà OK
N° 10	100 %	100 %	60%	100 %	100 %	OK
N° 11	60%	100 %	NA	40%	100 %	NOK

► Les contreparties déjà validées lors des périodes de tests précédentes ont conservé leur validation même en cas de volumétrie moins importante lors du live-timing de janvier-février. Pour **rappel**, les résultats de la validation lors des périodes de test précédentes étaient les suivants :


Septembre 2024						
Contrepartie	Enregistrements	Remboursements	Notations	Mobilisation	Démobilisation	Certification volumétrie
N° 1	100 %	NA	NA	100 %	100 %	OK
N° 2	73%	89%	NA	85%	35%	NOK
N° 3	100 %	10%	NA	100 %	54%	NOK
N° 4	NA	NA	NA	NA	NA	Déjà OK
N° 5	43%	21%	NA	45%	21%	Déjà OK
N° 6	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	OK
N° 7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Déjà OK
N° 8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	OK
N° 9	100 %	98%	100 %	100 %	100 %	OK
N° 10	73%	83%	20%	73%	40%	NOK
N° 11	60%	4%	NA	40%	20%	NOK

21

Juillet-Août 2024						
Contrepartie	Enregistrements	Remboursements	Notations	Mobilisation	Démobilisation	Certification volumétrie
N° 1	92%	NA	NA	3%	NA	NOK
N° 2	98%	100 %	NA	100 %	12%	NOK
N° 3	100 %	0%	NA	94%	12%	NOK
N° 4	70%	86%	NA	63%	100 %	OK
N° 5	100 %	55%	NA	100 %	100 %	OK
N° 6	83%	100 %	NA	41%	100 %	NOK
N° 7	100 %	57%	66%	100 %	85%	OK
N° 8	100 %	100 %	10%	100 %	100 %	NOK
N° 9	59%	57%	100 %	7%	3%	NOK
N° 10	100 %	100 %	0%	100 %	NA	NOK
N° 11	0%	52%	NA	40%	0%	NOK


# 4

## MIGRATION

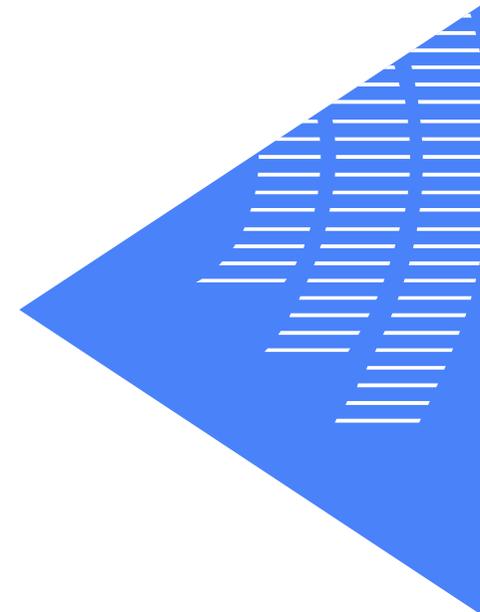

# JALONS CLÉS – ACTIVITÉS DE MIGRATION

## PROJECT TIMELINE AND GO/NO-GO CRITERIA MILESTONES

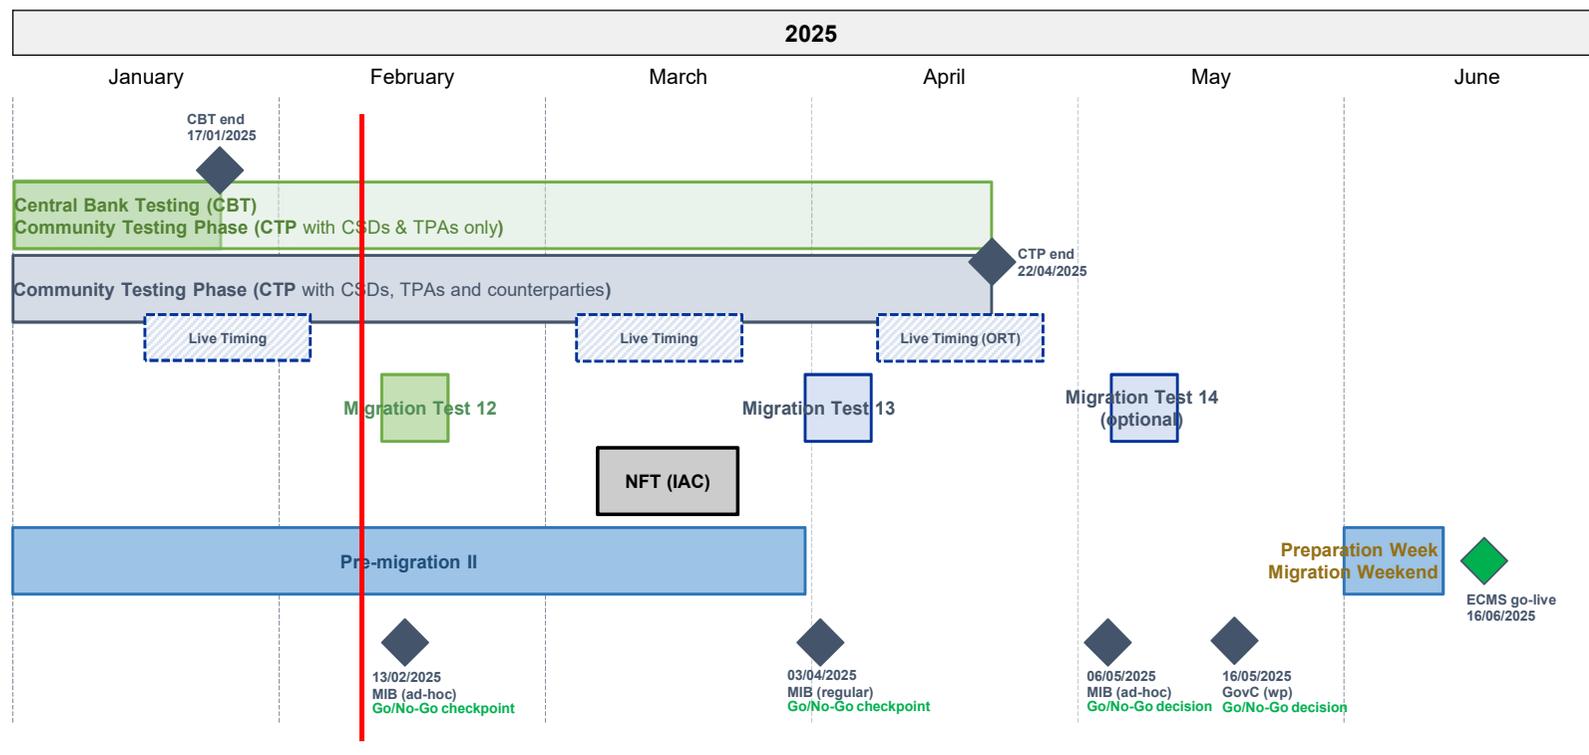

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION PRODUCTION\* PRE MIGRATION PHASE IIA

► La phase IIA concerne les **BCNs** elles est un préalable au démarrage des activités de Pré Migration

Phase	Démarrage	Fin	Activités	Acteurs	Critères d'entrée
Préparation de la phase IIA – Mise à jour des données référentielles	06/01/25	28/02/25	Technical Set-up de l' ECMS environment PM2.CP0	ECMS Operator	Green-light to unfreeze the production environment Reactivation of the Environment ECMS Operator shall check the access in U2A mode of the ECMS production environment is properly configured Only U2A access by ECMS operator and NCB users is allowed. Queues for A2A messages between ECMS and ESMIG will remain closed
			PM2.CP1	Utilisateurs BCNs	Les BCNs confirment leur préparation
			PM2.CP2	Utilisateurs BCNs	Vérification des: System parameters setup by the ECMS operators // NCB, CSD, TPA party data (including NCB specific parameters and registration forms verification) // Counterparty's reference data // Accounts and Pools // Messages subscription // Common components set-up //T2S configuration setup
				Utilisateurs BCNs	Les BCNs confirment leur préparation à la PM Phase IIB

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION PRODUCTION\*

### PRE MIGRATION PHASE IIB

► La phase IIB concerne les **BCNs et les CTPYs** : durant cette phase les acteurs vérifient la validité des données implémentées et les mettent à jour. En amont ils exécutent des tests de connectivité U2A et A2A.

Phase	Démarrage	Fin	Activités	Acteurs	Critères d'entrée
Pre-migration phase IIB CTPYs et tous utilisateurs / Connectivité			Réactivation de l'environnement ECMS aux CTPYs	ECMS Operator	L'Opérateur ECMS Operator a finalisé la préparation de l'environnement de PROD et réactivent l'accès aux CTPYs
	03/03/25	28/03/25	Vérification de la reference data CTPY	CTPY users	Les contreparties vérifient les données référentielles et les paramétrages et confirment leur validité
	03/03/25	28/03/25	Finalisation, mise à jour des droits d'accès users	NCB Users et CTPYs users	La liste des utilisateurs accrédités BCNS et CTPY est vérifiée ainsi que les droits d'accès. Les données sont mises à jour si nécessaire
			Connectivity testing	NCB User et CTPYs users	Créneau pour la connectivité A2A pour les acteurs ayant potentiellement modifié leurs modalités d'accès à l'environnement de production et éventuellement en cas de nouvel arrivant
	28/03/25		Report	NCB User et CTPYs users / ECB	Les acteurs confirment leur préparation sur la finalisation de la phase IIB – la queue pour l'échange de message A2A sera close
	28/03/25 17:00		Exécution d'un script pour désactiver l'accès ECMS aux CTPY users	ECMS Operator	

\* Les jalons communiqués ici sont prévisionnels, ils sont conditionnés à la production / actualisation de la documentation de référence par la BCE

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION PRODUCTION\*

### EVALUATION

- ▶ Évaluation et production des livrables → concerne **BCN, BCE et 4CB**
- ▶ Tout au long de la progression des activités les différents checkpoints font l'objet d'une évaluation globale, à différents niveaux
- ▶ Cette évaluation alimente les critères de décision pour le MIB Go –No Go decision

Séquence	Activité	Acteur	Durée	Démarrage	Fin
<b>Pre-migration Evaluation</b>	Pre-migration Evaluation		13 jours	31/03/2025 08:00	16/04/2025 17:00
<b>Pre-migration End Report (PMER)</b>	Pre-Migration preliminary report		13 jours	31/03/2025 08:00	16/04/2025 17:00
<b>Pre-migration phase II report</b>	Pre-Migration Phase II End Report (reporting period 20/01/2025 to 28/03/2025)		13 jours	31/03/2025 08:00	16/04/2025 17:00
	NCB drafting and submission	MigMan	6 jours	31/03/2025 08:00	07/04/2025 17:00
	4CB drafting and submission	4CB	6 jours	31/03/2025 08:00	07/04/2025 17:00
	ECB drafting	ECB	6 jours	31/03/2025 08:00	07/04/2025 17:00
	ECB report consolidation (V0.1)	ECB	1 jour	08/04/2025 08:00	08/04/2025 17:00
	ECMS-UTMSG review (V0.1)	UTMSG	2 jours	09/04/2025 08:00	10/04/2025 17:00
	ECB feedback implementation (V0.2)	ECB	1 jour	11/04/2025 08:00	11/04/2025 17:00
	ECMS-WG review (V0.2)	WG	1 jour	14/04/2025 08:00	14/04/2025 17:00
	ECB feedback implementation (V0.3) and submission for MIB review (V0.2)	ECB	2 jours	15/04/2025 08:00	16/04/2025 17:00
<b>Go - No Go Decision</b>	<b>Go - No Go Decision</b>	<b>MIB</b>	<b>1 jour</b>	<b>05/05/2025 08:00</b>	<b>05/05/2025 17:00</b>

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION PRODUCTION ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION – PREPARATION WEEK (semaine de préparation)

- ▶ La phase concerne les **BCNs et les CTPY** (sur le volet Credit Claims) :
- ▶ Durant cette phase les acteurs vérifient la bonne intégration et traitement des données référentielles issues des services ESCB dans ECMS
- ▶ Les CTPYS envoient les données relatives aux Credit Claims et récupèrent leur ECMS C.C. ID
- ▶ Au cours de cette phase l'atteinte du « Point of no return » est actée

Phase	Démarrage	Fin	Activités	Acteurs	Critères d'entrée
Migration Preparation week	02/06/25	13/06/25	Flux de connectivité entre ECMS et les services ESCB	ECMS Operator	La phase de Pre-Migration doit être finalisée avec l'atteinte du PMCP4 et le MIB donne son GO
			Migration des Credit Claims	NCBs CTPYs	Les critères de démarrage sont concluants
			Données MA data envoyées de ECMS vers T2S & TPAs	ECMS Operator	Tous les process sont opérationnels pour la finalization des activités de la semaine de préparation, livrables inclus (MWP, Monitoring and Coordination, Contingency procedures)
					Outstanding defects have a agreed correction implementation timetable
					ECMS PROD is available as expected with the relevant business day schedule and the expected support
					All relevant actors to confirm readiness to start the phase => start of MWCP1.0

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION PRODUCTION\* ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION – MIGRATION WEEKEND

► Le weekend de migration concerne l'ensemble des acteurs ECMS, dont les CTPYs

Phase	Démarrage	Fin	Activités	Acteurs	Critères d'entrée
Migration Weekend	13/06/25	15/06/25	Migration des Collateral et Credit positions	NCB Users	Toutes les activités précédentes, relatives à la semaine de préparation sont finalisées
			Migration des évènements CA en cours	NCB Users, CSD Users	ECMS PROD est disponible et la business day est correctement implémentée, le scheduler est opérationnel, conformément à l'attendu
			Pool valuation	ECMS Operator	Tous les process sont actifs pour la finalisation des activités du week-end, livrables inclus, particulièrement le document relative aux procédures de contingence
			OMO settlement et CL Updates	ECMS Operator	Confirmation des acteurs concernés pour le démarrage
	15/06		Penny test CTPY Acces	CSD CTPY	La réconciliation des données niveau BdF est finalisée, le Go est donné par la BdF aux CTPY

# MIGRATION

## PROCHAINS JALONS ACTIVITÉS DE MIGRATION – TEST 13\*

### ENVIRONNEMENT DE PRE-PRODUCTION – MIGRATION WEEKEND


- ▶ Les données transactionnelles sont purgées en amont
- ▶ Durant cette phase les BCN, S.D. et la BCE vérifient la bonne intégration et traitement des données référentielles issues des services ESCB dans ECMS
- ▶ Les CTPYS envoient les données relatives aux Credit Claims et récupèrent leur ECMS C.C. ID selon les modalités usuelles (date de freeze à convenir)
- ▶ Au cours de cette phase l'atteinte du « Point of no return » est actée (simulation dans le cadre de ce test)
- ▶ Une réconciliation des données migrées est systématiquement effectuée par la BdF, des corrections sont éventuellement apportées
- ▶ Les CTPY effectuent les réconciliations / vérifications sur la base des extractions fournies par la BdF après prononciation du feu vert

Weekday:	Lun-Merc	Vend	Vend	Sam	Dim	Lun	Mar
Calendar day:	17h	18h	18h45				
ECMS Business day (eod):	Lun- Mer	Ven	Lun	Lun	Lun	Lun	Mar
Main Migration Activities	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean up of all transac. Data (mercredi 17h)</li> <li>• Jeudi- Feu vert pour démarrer le PWDR</li> <li>• Activités de la semaine de préparation</li> <li>• Reception et integration des données issues des services ESCB</li> <li>• Collecte des champs manquants C.C.</li> <li>• Communication aux CTPYs des ECMS C.C. ID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feu vert pour le démarrage du MWDR</li> <li>• EOD à 19h. + changement de la B.D</li> <li>• Démarrage du weekend de Migration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migration des credit &amp; collateral positions</li> <li>• Pool valuation</li> <li>• Envoi des CL à CLM</li> <li>• CSD : envoi des CANO NEWM</li> </ul>	<p><i>Finalisation de la migration des CA</i>  <i>Fenêtre pour le Penny Test</i>  <i>Consultation des pools CTPY</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monday go-live (Live Timing)</li> <li>• Activités de Post migration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post go-live</li> </ul>	

\* Les jalons communiqués ici sont prévisionnels, ils sont conditionnés à la production / actualisation de la documentation de référence par la BCE

# 5

## FOCUS TECHNIQUE ET LEGAL

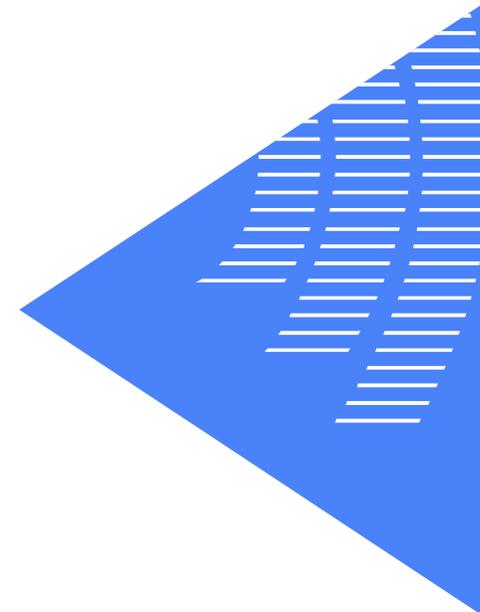

# STRATÉGIE DE MIGRATION DES CRÉANCES PRIVÉES

## Date d'arrêt de la remise TRICP

- ▶ Date de la remise : vendredi 6 juin 2025
- ▶ Date de valeur : lundi 9 juin 2025
- ▶ Les fichiers « champs manquants » seront mis à disposition le samedi 7 juin 2025 EoD
- ▶ Fichiers complétés attendus pour lundi 9 juin 2025 13h

## Période de FREEZE sur TRICP

- ▶ La dernière remise effective dans TRICP sera attendu le vendredi 6 juin 2025 => nécessaire pour garantir que les créances migrées dans ECMS correspondent aux créances mobilisées jusqu'à la fin de semaine
- ▶ Aucune remise à réaliser entre 9 et 13 juin 2025 (5 journées)
- ▶ Application d'une reconduction automatique par la Banque de France le mercredi 11 juin 2025 afin d'actualiser la valorisation des créances pour toutes les contreparties

## Impact sur le pool pendant la semaine de freeze (POBI)

- ▶ Le montant restera identique les 9 + 10 + 11 juin (remise du 6 juin)
- ▶ Le montant sera actualisé le jeudi 12 juin (reconduction réalisée le mercredi 11), et restera inchangé le vendredi 13 juin

# STRATÉGIE DE MIGRATION DES CRÉANCES PRIVÉES

## Remises ACC (créances PGE)

- ▶ Les PGE ne migrent pas dans ECMS
- ▶ **Pas de période de freeze prévue** = les remises seront attendues tous les jours, y compris pendant la semaine précédant la MEP ECMS
- ▶ La Banque de France enverra le flux ACC vers ECMS pour l'initialisation pendant le WE de migration, puis quotidiennement
- ▶ Information importante : La BCE a annoncé sur son site que les [PGE resteront éligibles a minima jusqu'à fin 2026](#). Ce Communiqué acte par ailleurs la fin du dispositif ACC (hors exceptions ciblées telles que les PGE) et l'intégration de certaines dispositions du cadre temporaire dans le cadre permanent (ABS de CQS3, titres dans certaines devises, etc.).

## Mise en production nouvelle version ACC

- ▶ Mise en production le jeudi 12 juin EoD
- ▶ Changement déjà connu : Priorisation ICAS
- ▶ **Nouvel élément** : Arrêt de l'acte de remise dans Onegate à compter d'ECMS
- ▶ A partir de la remise du vendredi 13 juin (valeur 16 juin) => Plus d'acte de remise Onegate attendu
- ▶ Des phases de tests seront prévues en environnement d'homologation ACC pour les contreparties

## Impact sur le pool (POBI)

- ▶ Les montants continueront à être actualisés quotidiennement jusqu'au passage à ECMS
- ▶ A partir du lundi 16 juin, le montant sera actualisé quotidiennement dans ECMS

# PRÉPARATION À LA MISE EN PRODUCTION – FOCUS TITRE

## Migration des titres CBL vers LuxCSD

- ▶ Tous les CSDs connectés à ECMS devront également être connectés à T2S.
- ▶ L'actuel CSD luxembourgeois Clearstream Bank Luxembourg (CBL) n'étant pas connecté à T2S, c'est LuxCSD qui le remplacera comme dépositaire central de titres après la mise en production d'ECMS, prévue le 16 juin 2025.
- ▶ L'actuelle plateforme de gestion de collatéral de politique monétaire utilisée par la Banque de France n'offrant pas la possibilité d'interagir avec LuxCSD, il sera nécessaire de transférer depuis CBL vers LuxCSD les positions détenues par les contrepartie françaises avant la mise en production d'ECMS.
- ▶ Cela permettra aux contreparties françaises de pouvoir gérer leur collatéral dès que ECMS sera mis en production.
- ▶ Cette migration aura lieu **mercredi 7 mai 2025**.
- ▶ **Période de gel** : entre le 6 mai et le 16 juin 2025, il ne sera donc plus possible de :
  - Démobiliser les positions migrées ;
  - Mobiliser des titres vers CBL / LuxCSD.
- ▶ Les montants mobilisés continueront néanmoins d'alimenter la ligne de crédit des contreparties concernées.
- ▶ **Aucune action n'est attendue de votre part.**
- ▶ Vous serez informés au fur et à mesure du déroulement de la migration.

## DOCUMENTATION CONTRACTUELLE

- ▶ Les conventions de gestion globalisée des garanties (3G) conclues entre la Banque de France et les contreparties ont été revues pour prendre en compte le passage à ECMS. Elles seront envoyées aux contreparties au mois d'avril 2025 et devront être signées par une personne habilitée (niveau 1) avant la MEP.
- ▶ Un document technique reprendra en complément les principaux éléments techniques nécessaires pour pouvoir utiliser ECMS. Notamment:
  - ▶ Étapes techniques pour rejoindre ECMS (contacts, documents tels que le registration form...)
  - ▶ Étapes réglementaires notamment sur les créances privées : choix de source, accords CCBM
  - ▶ Modèles de documents pour la gestion courante : acte de remise, mode dégradé
  - ▶ Le document sera disponible sur le site de la Banque de France d'ici juin 2025

# REGISTRATION FORMS ECMS DE PRODUCTION


## Campagne de collecte des Registrations form de PROD papier

- ▶ L'absence de retour de la part de la Banque de France d'ici fin février vaut validation de votre registration form papier de production

En attente de réception : RF papier - 3 contreparties - et DN non lisibles à l'impression – 5 contreparties


- ▶ Toute future modification qui interviendra dans votre Registration form nécessitera un renvoi du document en version électronique et papier signé par une personne habilitée.

**PROCHAINE RÉUNION DE PLACE**  
**VENDREDI 11 AVRIL 2025 11H00**

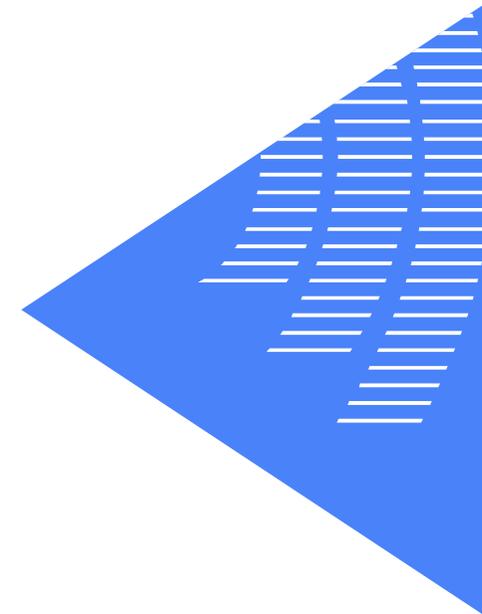

# 6

## ANNEXES

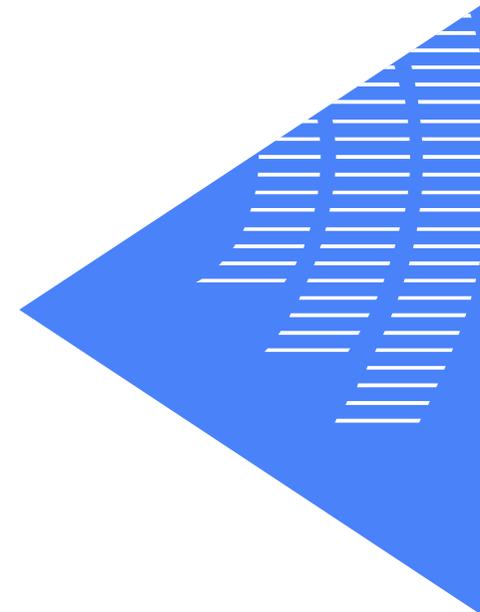

# LISTE DES ACRONYMES

<b>A2A</b>	Application-to-Application	<b>EOF</b>	Euroclear France
<b>ACC</b>	Additional Credit Claim	<b>FTD</b>	Fixed term deposit
<b>AMI-SeCo</b>	Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral	<b>GUI</b>	Graphical User Interface
		<b>HCB</b>	Home Central Bank
<b>BCN</b>	Banque Centrale Nationale	<b>MCA</b>	Main Cash Account
<b>CCB</b>	Correspondent Central Bank	<b>MLOR</b>	Marginal Lending On Request
<b>CCBM</b>	Correspondent Central Bank Model	<b>NSP</b>	Network Service Provider
<b>CCOAU</b>	Credit Claim Outstanding Amount Update	<b>OMO</b>	Open Market Operation
<b>CCR</b>	Credit Claim Registration	<b>OST</b>	Opération sur titres
<b>CCU</b>	Credit Claim Update	<b>RR</b>	Rating Registration
<b>CLM</b>	Central Liquidity Management	<b>RU</b>	Rating Update
<b>CTPY</b>	Counterparty	<b>SF</b>	Standing Facilities
<b>CSD</b>	Central Securities Depository	<b>TIPS</b>	TARGET Instant Payment Settlement
<b>CSLD</b>	ConSoLiDation project	<b>T2S</b>	TARGET-2 Securities
<b>ECMS</b>	Eurosystem Collateral Management System	<b>TPA</b>	Triparty Agent
<b>ECONS</b>	Enhanced Contingency Services	<b>U2A</b>	User-to-Application



STABILITÉ  
FINANCIÈRE  
ET OPÉRATIONS
